



OGGETTO: Immobile strategico palazzo Uffici Finanziari di Milano via Moscovia/Manin/Tarchetti

Dir. Direzione Regionale

Dr. Rita Soddu

Resp. U.O. Serv. Tecn.

Arch. Marco Pozzoli

RUP

Ing. Francesco Garau


Direzione Regionale della Lombardia 20136 MILANO Corso Monforte 32 T. 02.7626181 F. 02.762618292 mail: dre.lombardia_ste@agenziademanio.it

<p>STUDIO DI MLG ARCHITETTURA</p> <p>dr. Giuseppe Maurizio La Gamba cremona 45, via dante t/f 0372.23800 mlg@studiomlg.com</p>	<p>PROGETTO: Recupero porzione III piano ad Uffici</p> <p>LUOGO: MILANO -via Moscovia 2</p>	<p>SICUREZZA 81.08</p> <p>CRONOPROGRAMMA dei LAVORI</p>	<p>data: sett.2017</p>
	<p>committente: AGENZIA DEL DEMANIO - DIR. REG. LOMBARDIA</p> <p>progettista: ARCH. G.MAURIZIO LA GAMBA</p> <p>dir. lavori: _____</p> <p>path name: docS3_02_Gantt</p>	<p>tav. n°</p> <p>S.3.02</p>	<p>aggiornamento: febbr.2018</p>
	<p>Ordine Architetti Prov. Cremona n° 337 cod.fisc. LGMGPP64D13D150R P.iva 01003440193</p>		<p>sostituisce tav. n°:</p>
			<p>scala:</p>

CRONOPROGRAMMA - diagramma di GANTT

DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	1	Consegna dei lavori	01/10/2018	01/10/2018	0
2	2	Preparazione cantiere	01/10/2018	03/10/2018	2
3	3	RIMOZIONI e DEMOLIZ.	01/10/2018	29/10/2018	28
4	4	ASSIST. 1 + IDRO + ELETTRICO	18/10/2018	01/11/2018	14
5	5	SOTTOFONDO E MASSETTO	01/11/2018	15/11/2018	14
6	6	DIVISORI E TAMPONAMENTI	08/11/2018	20/12/2018	42
7	7	RECUPERO SERRAMENTI FALEGNAMERIA	20/12/2018	03/01/2019	14
8	8	ASSIST. 2 + IDRO + ELETTRICO	20/11/2018	04/12/2018	14
9	9	INTONACI	10/12/2018	17/12/2018	7
10	10	CONTROSOFFITTI	20/12/2018	03/01/2019	14
11	11	ISOLAM. ACUSTICO	03/01/2019	07/01/2019	4
12	12	INFISSI E SERRAMENTI - ESTERNO	07/01/2019	14/01/2019	7
13	13	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	14/01/2019	04/02/2019	21
14	14	TINTEGGIATURE	04/02/2019	11/03/2019	35
15	15	MONTAGGI IDRO - ELETTRICO - PORTE	11/03/2019	25/03/2019	14
16	16	RITOCCHI +SISTEMAZIONE CONFINANTI+VARIE	25/03/2019	01/04/2019	7
17	17	SMOBILIZZO CANTIERE	01/04/2019	02/04/2019	1

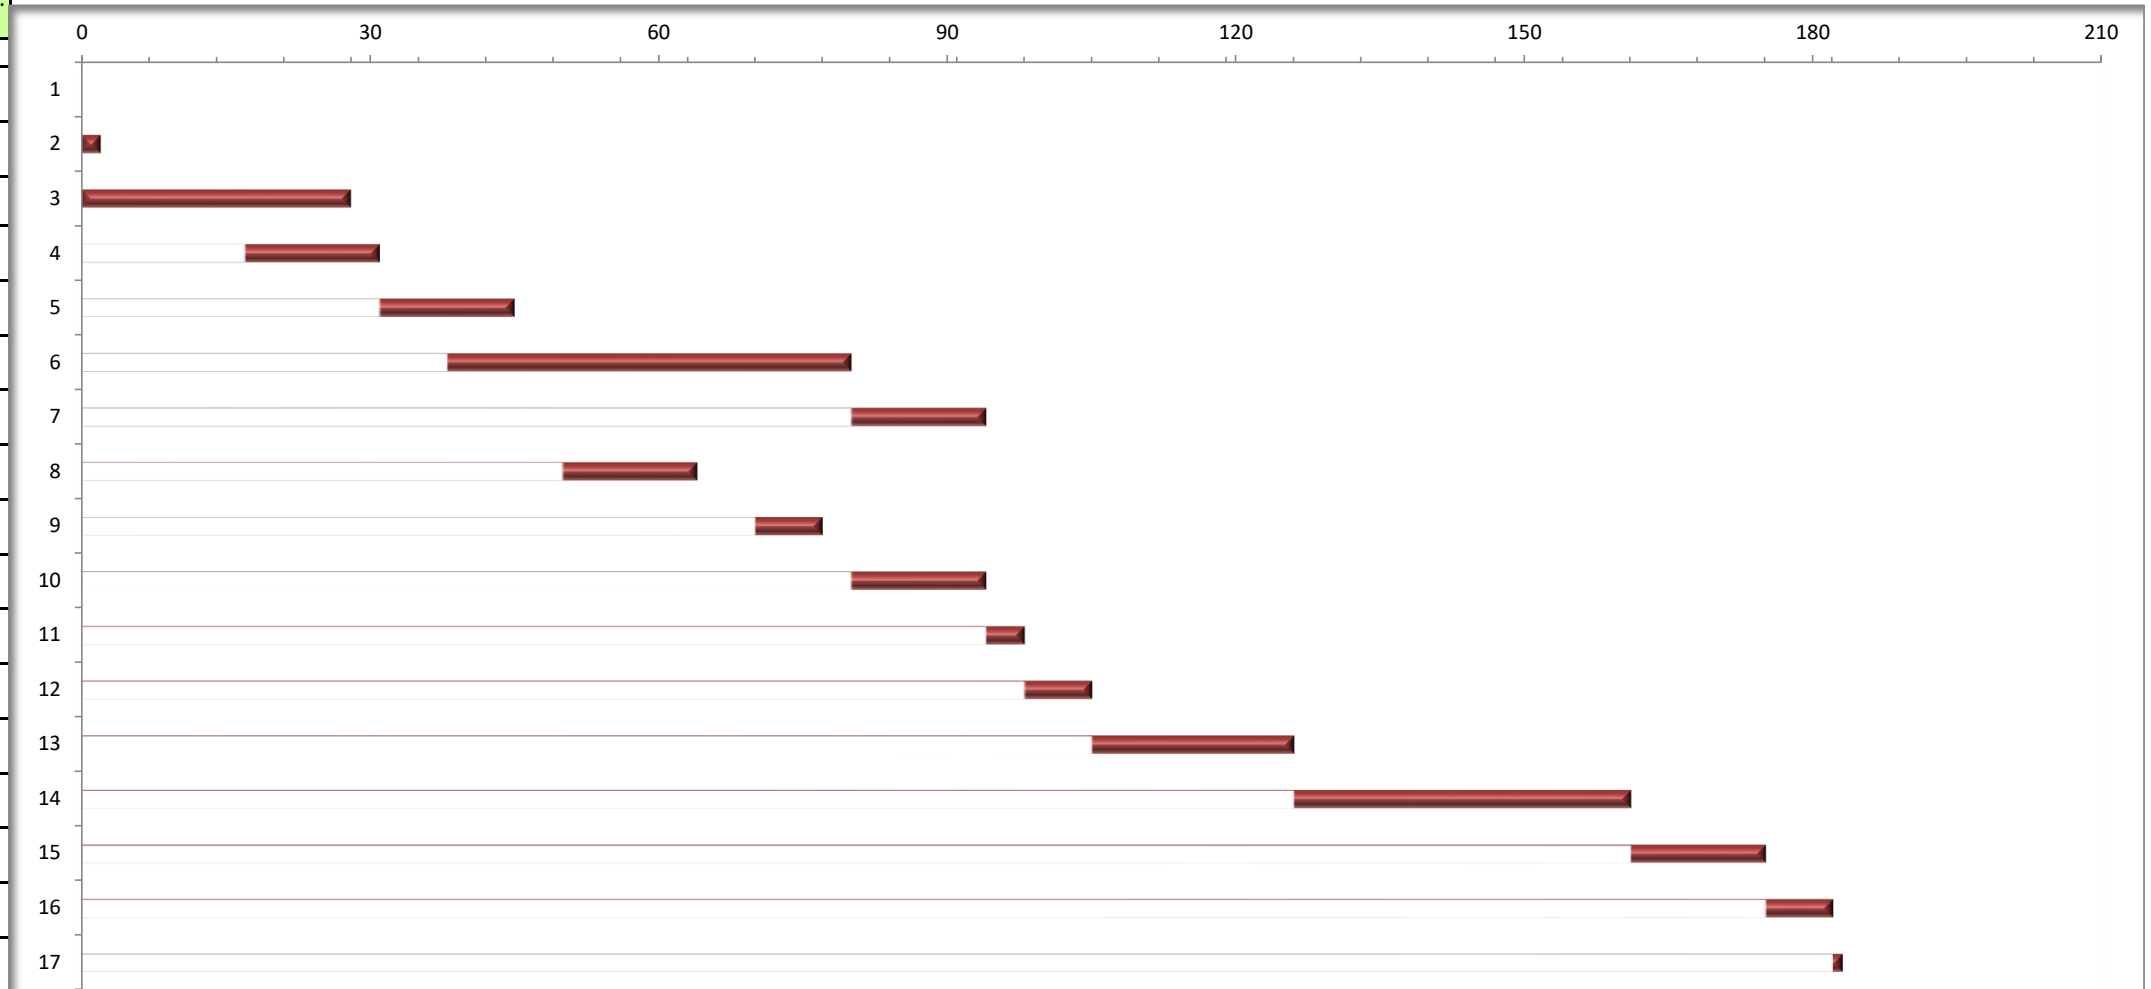

TC

183	gg.
naturali consecutivi	

8	PRESENZA MEDIA GIORNALIERA
1464	TOTALE UOMINIXGIORNO

Inizio dei lavori	
0	gg

Fine lavori	
183	gg

indica sovrapposizione di lavorazioni
